


FICHA DE POÇO

Num. Cerb :	Num. Corpore : 26890	Latitude (S): 13°58'31,5" -
Município : CAETITÉ		Long. (W): 42°27'35,1"
Localidade : LAGOA DO CANTO (DOIS)		Prof. util (m): 93,00
Data Início : 25/10/2018		Ne(m) : 12,00
Data Fim : 26/10/2018		Nd(m) : 22,75
Rocha : META-SEDIMENTAR / XISTO		Q (m³/h): 9,00
Aquífero : FISSURAL		Data Teste : 05/04/2019
Equip. : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)		Duração: 12:00h
Emp Resp. : CERB		Recuperação : 7,65m em 01:00h
Emp .Exec.: PROSOLO		Programa : BAHIA PRODUTIVA
Tec. Loc. : JORGE CAETANO COSTA		
Tec. Perf : DANILO DE SOUZA SANTOS		
Sondador : ROBSON RONI RIBEIRO DA ROCHA		


MAPA GEOLÓGICO DE LOCALIZAÇÃO

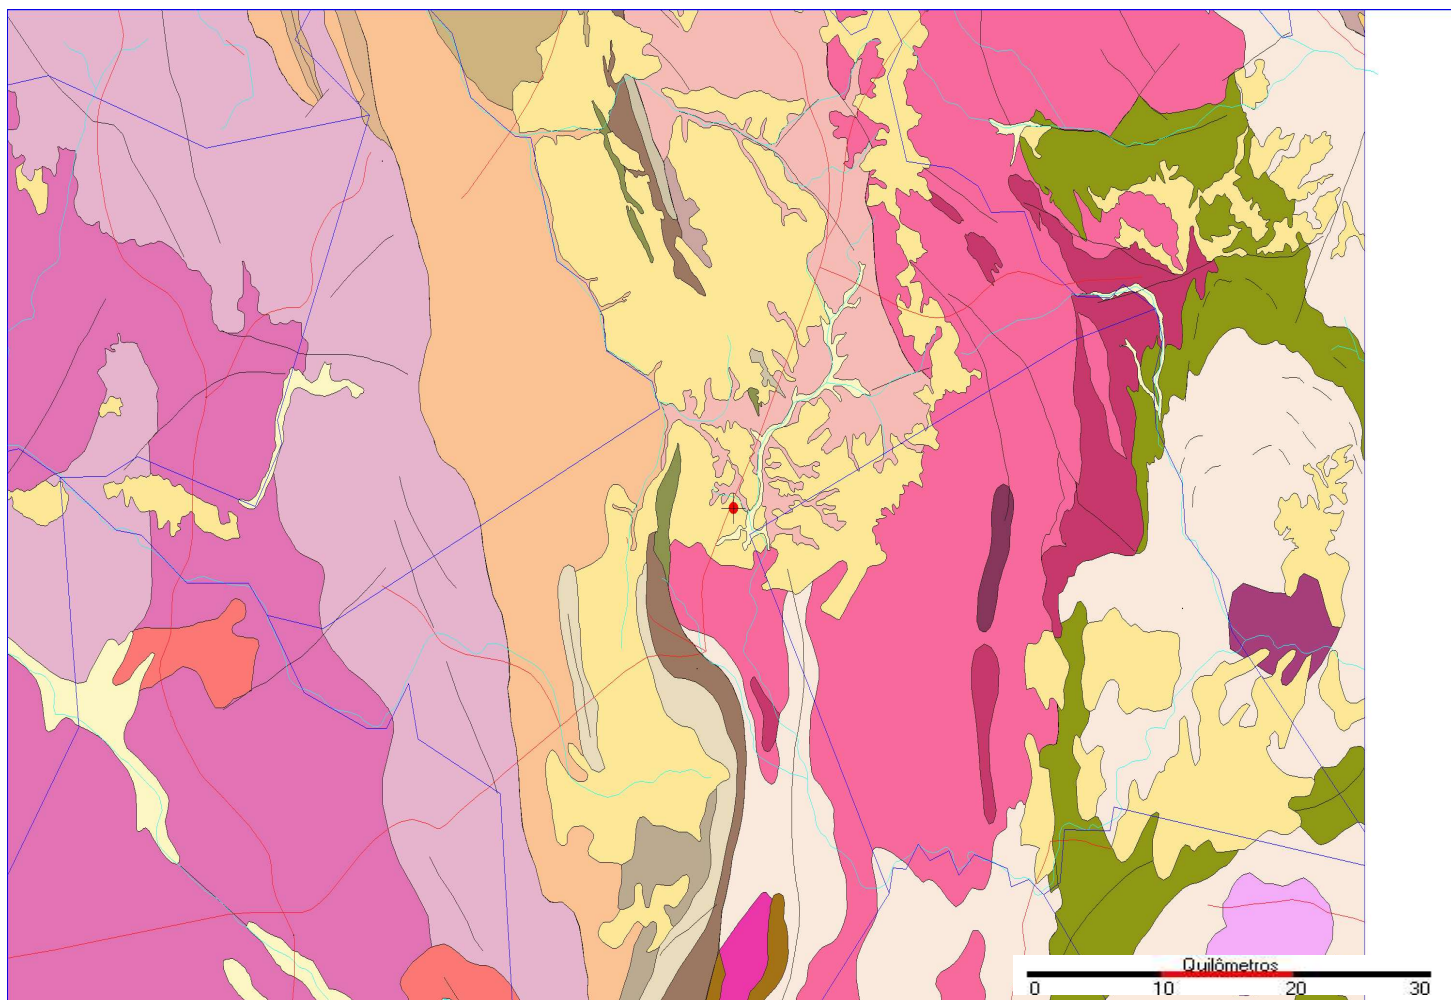

MAPA GEOLÓGICO CPRM -

Mapa CPRM - Folha(s) - SD23_Brasília

NP1so - Formação Santo Onofre	Q2a - Depósitos aluvionares	P4M1bf - Fazendinha
A3po - Paramirim - ortognaisses	P4M1br - Riacho do Bento	A2gm - Gavião, migmatitos
PP4_gamma_I1 - Lagoa Real - ortognaisses	A4bb - Boquira - unidades Boquira e Botu	
NQdl - (Não definida) Coberturas detrito	P4M1bm - Mosquito	

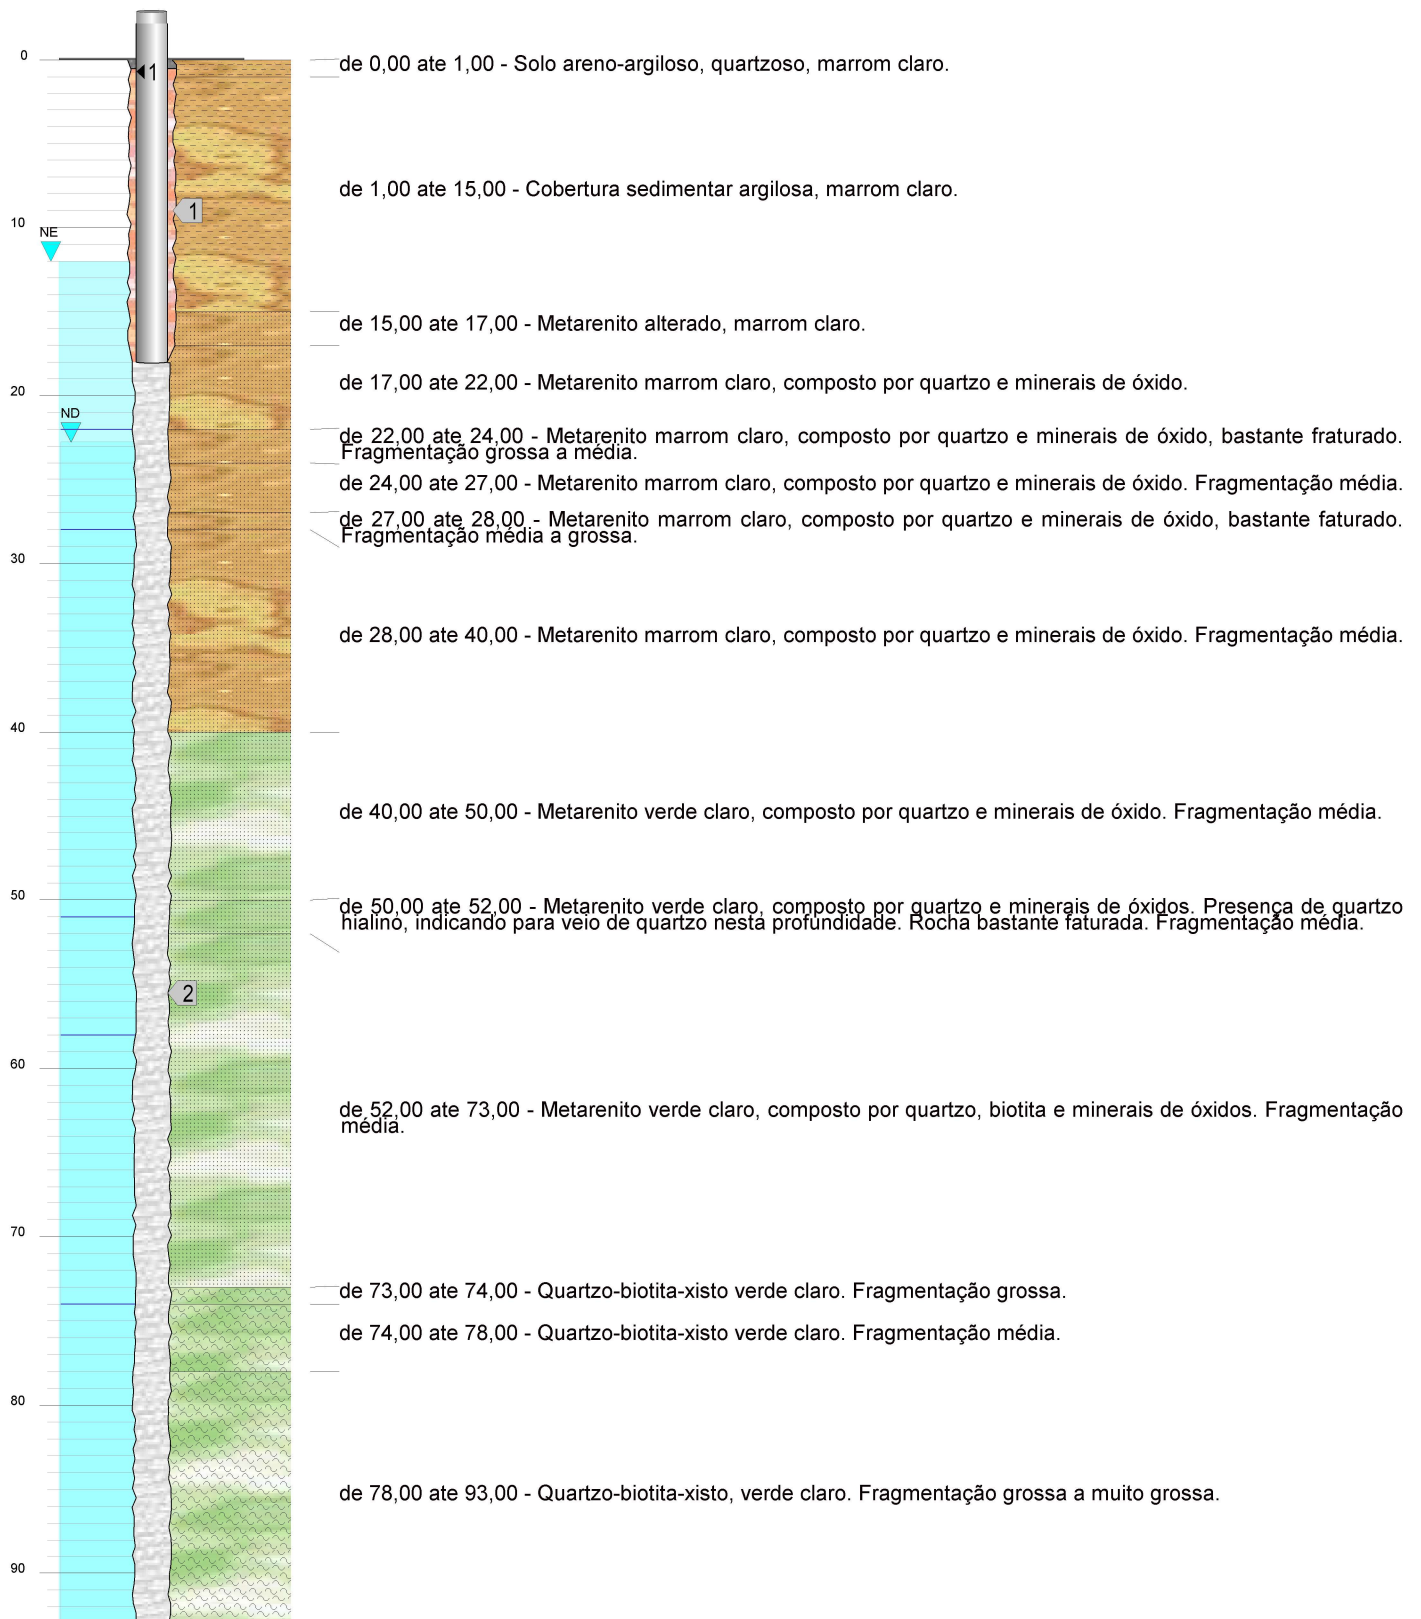

TAB. DE PERFURAÇÃO

Ø (pol)	De	Até
8"	0,00	18,00
6"	18,00	93,00

ENTRADA DE ÁGUA

N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*
1	22,0	4,4	5	74,0	0,50			
2	28,0	4,4						
3	51,0	0,5						
4	58,0	1,0						



TABELA DE REVESTIMENTO

Ø (pol)	De	Até	Material
6"	0,00	18,00	DIN 2440

TOTAL - DIAMETRO DE 6" : 18,00 m

BOCA DO POÇO

Ø (pol)	Comp.(m)	Cota(m)	Material
6"	1,00		DIN 2440



OBSERVAÇÕES:

Poço: Caetité - Lagoa do Canto (Dois) / Jurema / Lagoa do Maciel.

Poço situado em área pública. Termo de cessão assinado pelo Prefeito Municipal, Sr. Aldo Ricardo Cardoso Gondim.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Caio Muller Maia.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h, com Compressor Chicago Pneumatic 350psi / 950cfm, tendo apresentado 10,80m³/h de vazão.

A CERB / PROSOLO, em 27.03.2019, esteve no poço para realizar teste de bombeamento, mas encontrou este obstruído aos 54,00m. Fiscalização pela Geol. José Guilherme Grassini Silva.

A CERB / PROSOLO, em 03.04.2019, efetuou desobstrução de 54,00m a 93,00m e 05:00h de desenvolvimento com Compressor Chicago Pneumatic 350psi/950cfm (fenda por fenda, com múltiplas reversões). Fiscalização pela Geol. Caio Muller Maia.

A CERB / PROSOLO, de 04 a 05.04.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. Caio Muller Maia. Dados obtidos:

PROF=93,00m

NE=12,00m

ND=22,75m

Q=9,00m³/h

RECUPERAÇÃO=7,65m em 01:00h
